



**REPUBLIKA HRVATSKA**

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

Operativni plan provedbe  
Programa e-Hrvatska 2007.  
Godišnji izvještaj za 2007. godinu

**Naslov dokumenta**

Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007. - Godišnji izvještaj za 2007. godinu

**Svrha dokumenta**

Pregled provedbe mjera i stanje informatiziranosti javnih usluga planiranih Operativnim planom provedbe Programa e-Hrvatska 2007 s pregledom aktivnosti u 2007. godini.

**Oznaka**

SDUe-H-08/PeHR-01

**Priredili:**

dr.sc. Diana Šimić, dipl. ing. mat.  
Tajana Repulec, prof.  
Maria Božić, dipl. polit.

**Status**

Radni tekst

**Verzija**

1.7

**Datum verzije**

17.3.2008.

**Izvor**

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

**Autorsko pravo:**


Ovo je javni dokument. Dozvoljeno je kopiranje i raspačavanje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova teksta.

---

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Pregled provedbe mjera .....</b>	<b>2</b>
1.1	Infrastruktura .....	3
1.1.1	<i>Telekomunikacije - širokopolasni pristup .....</i>	<i>3</i>
1.1.2	<i>Sigurnost.....</i>	<i>4</i>
1.1.3	<i>HITRONet.....</i>	<i>6</i>
1.2	Inovativnost i istraživanje.....	7
1.3	HITRO.HR .....	7
1.3.1	<i>e-Poslovanje .....</i>	<i>7</i>
1.3.2	<i>e-Pravosuđe.....</i>	<i>8</i>
1.3.3	<i>e-Zdravstvo .....</i>	<i>9</i>
1.3.4	<i>e-Obrazovanje .....</i>	<i>10</i>
1.3.5	<i>e-Kultura .....</i>	<i>12</i>
1.3.6	<i>e-Javna uprava .....</i>	<i>13</i>
1.4	Praćenje pokazatelja razvoja informacijskog društva .....	25
1.5	Međunarodna suradnja.....	26
1.6	Mehanizmi provedbe .....	29
<b>2</b>	<b>Razina informatiziranosti usluga.....</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>Pregled kratica .....</b>	<b>42</b>
<b>4</b>	<b>Popis koordinatora .....</b>	<b>47</b>

## 1 Pregled provedbe mjera

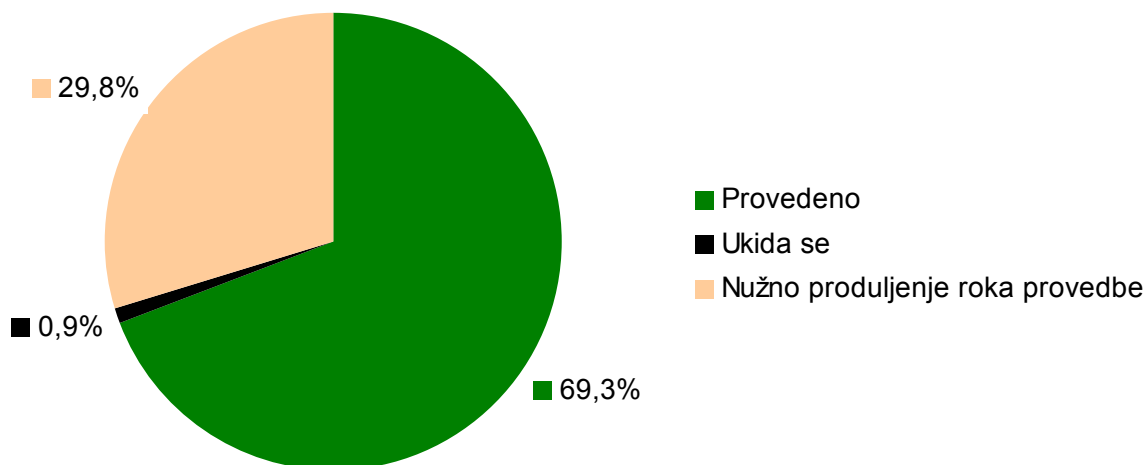

Mjere*	Ukupno	%
Provedeno	79	69,3%
Ukida se	1	0,9%
Nužno produljenje roka provedbe	34	29,8%

\* U statistiku nisu uključene mjere koje se provode trajno, te mjere kojima je rok za provedbu 2008. godina

## 1.1 Infrastruktura

### 1.1.1 Telekomunikacije - širokopojasni pristup

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
31101	Uspostavljanje dijeljenog pristupa	HAT	6-2007	Provedeno
Provedba: Donesena je odluka o suglasnosti na Standardnu ponudu HT-a.				
31102	Uspostavljanje "bitstream" pristupa	HAT	10-2007	Provedeno
Provedba: Donesena je odluka o suglasnosti na Standardnu ponudu HT-a.				
31103	Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje radijskih i televizijskih programa	MMTPR, MK, HAT, VEM	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Strategija je u izradi, te je predviđeno njezino donošenje za III. Kvartal 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. donijela Odluku o iznosu i načinu raspodjele viška sredstava koji čini razlika između prihoda i rashoda Hrvatske agencije za telekomunikacije (HAT) u 2006. godini, u skladu s kojom se zadužuje HAT da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pokrene postupke javnog nadmetanja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 117/01 i 92/05), u svrhu provedbe mjera i aktivnosti iz točaka 1., 2., 3. i 5. Dodatka 1. ove Odluke. Pod točkom 1. Dodatka 1. navedena je mjera: Izrada prijedloga Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje radijskih i televizijskih programa. U srpnju 2007. godine stupio je na snagu Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala u zemaljskim radiodifuzijskim uređajima (NN 73/07). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine donijela Odluku o načinu raspodjele sredstava te kriterijima i mjerilima za davanje potpore fizičkim osobama koje plaćaju radijsku i televizijsku pristojbu, prigodom nabave uređaja za prijam digitalnih televizijskih signala na području Istarske županije. Sva kućanstva u Istarskoj županiji od 31. listopada 2007. godine imaju mogućnost prijma televizijskih programa koji se odašilju u digitalnoj tehnologiji (DVB-T), što predstavlja ogledni primjer za uvođenje digitalne televizije i u ostalim dijelovima Hrvatske. HAT provodi projekt "Support in development of Strategy for Implementation of Digital Terrestrial Broadcasting Service in Croatia" u sklopu EU programa PHARE 2005 te potpisan okvirni ugovor pod brojem N° 2005-0707-012301 u studenom 2007. HAT je pripremila i raspisala 26. studenog 2007. natječaj za savjetničke usluge za izradu Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje radijskih i televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 02. kolovoza 2007. o iznosu i načinu raspodjele viška sredstava koji čini razlika između prihoda i rashoda Agencije ostvarenih u 2006. godini, međutim isti je natječaj poništen s obzirom da je zaprimljena samo jedna ponuda.				
31104	Stvaranje uvjeta za uspostavljanje potpune pokrivenosti Republike Hrvatske bežičnim pristupom	HAT	12-2007	Provedeno
Provedba: Donesene su odluke o davanju koncesija za uporabu frekvencija za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u svim županijama RH i Gradu Zagrebu.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
31105	Strategija razvoja telekomunikacija u Republici Hrvatskoj	MMTPR	12-2007	Ukida se
Provedba: Strategija se neće donijeti. Stupanjem na snagu novog Zakona o elektroničkim komunikacijama (I.Q 2008.) prestaje zakonska obveza donošenja navedene strategije.				
31106	Poticanje razvoja širokopojasnih sadržaja i usluga	MMTPR, MK, MZOŠ, SDUeH	trajno	Provodi se
Provedba: Temeljem Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu Vlada Republike Hrvatske 2.8.2007. godine donijela je Odluku o iznosu i načinu raspodjele viška sredstava koji čini razlika između prihoda i rashoda Hrvatske agencije za telekomunikacije ostvarenih u 2006. godini čime su osigurana financijska sredstva za poticanje sudjelovanja tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u uspostavljanju povoljnog okruženja za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu (programi za osposobljavanje lokalne samouprave za pripremu razvojnih projekata, analiza najbolje prakse iz Hrvatske i inozemstva); pripremu pregleda i smjernica za razvoj modela javno-privatnog partnerstva za razvoj širokopojasne infrastrukture i usluga; te izradu prijedloga poreznih olakšica i drugih mjera za privatne poduzetnike koji žele ulagati u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu u hrvatskim regijama gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za takva ulaganja.				

### 1.1.2 Sigurnost

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
31201	Upućivanje Zakona o tajnosti podataka i Zakona o informacijskoj sigurnosti u saborsku proceduru	UVNS	1-2007	Provedeno
Provedba: ZTP i ZOIS su doneseni na saborskom zasjedanju u srpnju 2007.godine, objavljeni u NN 79/2007.				
31202	Izmjena statuta CARNet-a u svrhu organizacije novog Nacionalnog CERT-a	CARNet, UVNS, ZSIS	11-2007	Provedeno
Provedba: Čeka se suglasnost MZOŠ-a. Izmjene statuta prihvaćene od Upravnog vijeća CARNeta i UVNS-a.				
31203	Izrada Nacrta prijedloga Nacionalne politike informacijske sigurnosti	UVNS	9-2007	Provedeno
Provedba: Umjesto donošenja Nacionalne politike informacijske sigurnosti, u Zakon o informacijskoj sigurnosti su ugrađena dva nova poglavlja: II. Mjere i standardi informacijske sigurnosti i III. Područja informacijske sigurnosti u kojima se tretira materija koja se planirala razraditi NPIS-om.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
31204	Koordinacija organizacijskih aspekata provedbe Zakona o informacijskoj sigurnosti	UVNS	12-2007	Provedeno
Provedba: Započeto u lipnju nakon imenovanja ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS), nastavljeno nakon donošenja Zakona o informacijskoj sigurnosti u srpnju dogovorom s CARNet-om oko promjene statuta u svrhu osnivanja Nacionalnog CERT-a. Trenutno u tijeku koordinacija UVNS-ZSIS-NCERT s ciljem koordinacije rada i regulative u području sigurnosti informacijskih sustava. Predlaže se promjena roka provedbe u Trajno.				
31205	Razvoj sigurnosne svijesti i sigurnosna edukacija	UVNS, ZSIS, CARNet	Trajno	Provodi se
Provedba: Ograničenja za provedbu ove mjere postoje sve dok se ne razradi kompletan regulativni okvir koji čine i zakoni i podzakonski propisi, a što se planira u prvoj polovini 2008. godine.				
31206	Usklađivanje rada svih tijela u RH nadležnih za poslove informacijske sigurnosti sukladno Zakonu o sustavu informacijske sigurnosti, formiranje koordinacijskog radnog tijela, zaključno izvješće s projekcijom daljnjeg načina rada tijela	UVNS	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Realizirano u točki 31204 u području sigurnosti informacijskih sustava za potrebe dovršetka regulative, bit će moguće u širem smislu ove mjere tek po donošenju potpunog regulativnog okvira informacijske sigurnosti u RH u 2008. godini.				
31207	Izrada preporuka za uvođenje sigurnosnih standarda IT opreme u okviru javne nabave u RH	UVNS, ZSIS, SDUeH	6-2008	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Realizacija mjere bit će moguća tek po donošenju potpunog regulativnog okvira informacijske sigurnosti u RH u 2008. godini.				
31208	Prijedlog programskih sadržaja informacijske sigurnosti koje treba uključiti u državni stručni ispit	UVNS, ZSIS, SDUU	6-2008	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Realizacija mjere bit će moguća tek po donošenju potpunog regulativnog okvira informacijske sigurnosti u RH u 2008. godini.				
31209	Praćenje projekta HITRONet sa sigurnosnog aspekta, izrada polugodišnjih sigurnosnih preporuka te analiza njihove provedbe s nositeljima projekta HITRONet	UVNS, ZSIS, CARNet	Trajno	Provodi se
Provedba: Provodi se kroz suradnju s SDUeH.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
31210	Izrada brošura, Web stranica i održavanje seminara za državna tijela s ciljem razvoja sigurnosne svijesti u državnoj upravi te u svrhu razumijevanja procesa informacijske sigurnosti koji se odvijaju u državnoj upravi, u okviru poslovnog sektora i građanstva (naročito problematika NATO i EU integracija)	UVNS, ZSIS	Trajno	Provodi se
Provedba: UVNS se aktivno uključio u problematiku informacijske sigurnosti u NATO okruženju kroz suradnju s drugim NSA tijelima te učestvovanje na NATO kongresima. U okviru RH za sada je mjera realizirana učešćem stručnih djelatnika UVNS-a na javnim skupovima u obliku predavanja, okruglih stolova, priloga i intervjuja za javne Web stranice i portale te stručnih radova i drugih materijala na temu informacijske sigurnosti na znanstvenoj i stručnoj razini.				
31211	Izrada brošura, Web stranica i održavanje seminara za građanstvo s ciljem razvoja sigurnosne svijesti u najširim slojevima stanovništva	CARNet	Trajno	Provodi se
Provedba: Web stranice www.cert.hr se obnavljaju kontinuirano. Objavljena brošura drugo izdanje "Priručnika za računalnu sigurnost korisnika Interneta".				

### 1.1.3 HITRONet

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
31302	Registriranje HITRONet ASN pri RIR-u	SDUeH	10-2007	Provedeno
31303	Povezivanje HITRONet na CIX	SDUeH, Fina	10-2007	Provedeno
31304	Ugovor o uslugama HITRONet-a	SDUeH	10-2007	Provedeno
31305	Uspostavljanje Odjeljka HITRONet u SDUeH	SDUeH	6-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Zbog nedostatka ljudskih resursa mjera je odgođena.				
31306	Upostavljanje strukture upravljanja HITRONet-om	SDUeH	6-2007	Provedeno
31307	Uspostavljanje točke prisutnosti TESTA-S u HITRONet-u	SDUeH, Fina	10-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Mjera je odgođena jer je Europska komisija pokrenula proces migracije cjelokupne TESTA-S mreže na novu konfiguraciju.				
31308	80% servisa elektroničke javne uprave središnjih tijela državne uprave smjestiti u HITRONet	Sva TDU, APIS IT, Fina	6-2008	Provodi se

## 1.2 Inovativnost i istraživanje

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
32101	Poziv za prijavu znanstvenih projekata i programa	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Nadogradnja javnog web servisa za prijavu, odabir i financiranje znanstvenih projekata obavljena je prema planu.				
32201	Poziv za prijavu tehnoloških projekata	MZOŠ, HIT	Trajno	Provodi se
Provedba: U okviru programa HITRA i potprograma TEST od ukupno prijavljenih 482 projekta za financiranje je odobreno njih 252 (52%). Završen je projekt SMS Informativka.				
32301	Poziv za prijavu projekata primjene IT	MZOŠ	10-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Nadogradnja javnog web servisa za prijavu, odabir i financiranje projektata informacijske tehnologije je obavljeno je prema planu.				
32401	Predstavljanje znanstvenicima i javnosti e-Infrastrukture	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Potpisan ugovor o radu na projektu "Usluge održavanje i unaprjeđenja postojećeg središnjeg informacijskog sustava visokog učilišta" između MZOŠ, Srce - 16.05.2007.				
32402	Uspostavljanje upravljačkog sustava koji uključuje sve sudionike e-Infrastrukture	MZOŠ, Srce, FER, IRB	6-2007	Provedeno

## 1.3 HITRO.HR

### 1.3.1 e-Poslovanje

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33101	Donošenje Strategije razvoja elektroničkog poslovanja	MINGORP, HGK, SDUeH	10-2007	Provedeno
Provedba: Dana 07. prosinca 2007. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o prihvaćanju Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u RH za razdoblje 2007.-2010.				
33102	Izvedba i provedba programa kampanje za elektroničko poslovanje	MINGORP, HGK	3-2008	Provodi se
33103	Preporuke za izradu pravila i norma za oblikovanje elektroničkih ugovora	MINGORP, HGK	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Donošenjem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u RH za razdoblje 2007.-2010., rok za provedbu mjera produljen je na lipanj 2008.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33104	Dovršetak I. faze uspostave portala za e-Obrazovanje poduzetnika	MINGORP	10-2007	Provedeno
Provedba: I. faza dovršena u roku: * korisnici projekta, 51 potporna institucija poduzetništva koje provode programe obrazovanja u i za poduzetništvo nazočila obrazovnom seminaru za primjenu programa na Portalu * institucije se uključuju samostalno korištenjem aplikacije GlobalAdmin * Portal je kreiran korištenjem standarda postojeće WEB stranice MINGORP-a * planira se organizirati javnu objavu Portala u suradnji s tzv. "udaljenim WEB uredništvom" tj. potpornim institucijama i drugim zainteresiranim sudionicima.				
33105	Prilagodba carinske i porezne regulative	MFIN	12-2007	Provedeno
33106	Reorganizacija poslovnih procesa Carinske i Porezne uprave	MFIN	12-2007	Provedeno
33107	Priprema norma u području informacijske tehnologije (usvajanje min 10 norma)	HZN/TO Z1 SDUeH	12-2007	Provedeno
Provedba: Prijedlog za prihvaćanje 45 međunarodnih i europskih norma iz područja informacijske tehnologije upućeno je na javnu raspravu u HZN Glasilu 5/2007 i 6/2007. Objava obavijesti o prihvaćenim normama predviđena je u HZN Glasilu 1/2008 koje izlazi krajem veljače 2008. godine. Predlaže se promjena roka provedbe na veljaču 2008.				
33108	Upoznavanje managementa u gospodarstvu sa strukturom i dostignutom razinom primjene elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj	HGK, SDUeH	3-2008	Provodi se
Provedba: Mjera se provodi nakon usvajanja Strategije razvitka e-poslovanja u RH u razdoblju 2007. - 2010. koja je usvojena u prosincu 2007.				

### 1.3.2 e-Pravosuđe

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33201	Uspostavljanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i Bazu zemljišnih podataka (BZP)	DGU, MP	6-2008	Provodi se
33202	Pilot faza ICMS	MP, FINA	7-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Pilot faza ICMS nije dovršena sukladno planu jer su tek u studenom 2007. instalirani produkcijski serveri isporučeni kroz CARDS 2004 projekt. Ovo je bio preduvjet da Općinski kazneni i građanski sud u Zagrebu krenu u pilot. Trgovački sud u Zagrebu zbog problema sa mrežom koji su otklonjeni krajem 2007. godine još uvijek je u pilotu. Predlaže se produljenje roka provedbe na rujun 2008. godine.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33203	Modernizacija i tehnološko unaprjeđenje sudskog registra	MP	12-2007	Provedeno
Provedba: Ugrađene nove funkcionalnosti sukladno Zakonu o sudskom registru i Zakonu o trgovačkim društvima, mogućnost on-line prihvata zahtjeva za registraciju trgovačkog društva putem HITRO.HR servisa, preduvjeti za digitalnu zbirku isprava.				
33204	Pilot projekt on-line sudskog registra	MP, SDUeH, FINA, JBK	12-2007	Provedeno
Provedba: Pilot uspješno proveden na Trgovačkom sudu u Varaždinu za područje nadležnosti javnih bilježnika varaždinske i međimurske županije.				
33205	Projektiranje i generičko kabliranje pravosudnih tijela	MP, FINA	12-2007	Provedeno
Provedba: Sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu za 2008. godinu napravljene lokalne računalne mreže za 40 pravosudnih tijela radi spajanja na okosnicu HITRONet-a. Nastavlja se sa umrežavanjem ostalih tijela sukladno planu racionalizacije sudova u RH.				
33206	Implementacija Zatvorskog informacijskog sustava	MP	12-2007	Provedeno
Provedba: Završena pilot faza Zatvorskog informacijskog sustava na 7 lokacija - razmjena informacija vezano za status iz Matica u elektroničkom obliku.				
33207	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	MP, DGU	Trajno	Provodi se
Provedba: Ugovor za dobavu i instalaciju Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra i Bazu zemljišnih podataka potpisan je 29. svibnja 2007., dok je efektivni datum s kojim su započele aktivnosti po ugovoru ostvaren 30. srpnja 2007. U proteklih šest mjeseci provedbe ugovora završen je i usuglašen detaljni projektni plan, isporučena je početna faza - faza analize postojećeg stanja i sadašnjih poslovnih procesa te pripremljene detaljne specifikacije standardnog softvera i hardvera koje su osnova za planiranu nabavu tehničke platforme ZIS-a. Ugovor se trenutno nalazi u fazi definiranja korisničkih zahtjeva i budućih poslovnih procesa u ZIS-u.				

### 1.3.3 e-Zdravstvo

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33301	Završetak I.faze projekta e-Zdravstveno	MZSS, HZZO	3-2007	Provedeno
Provedba: Završena je i II.faza projekta e-zdravstveno u kolovozu 2007. Završetkom II.faze omogućene su prijave/odjave/promjene na obvezno zdravstveno osiguranje sigurnim načinom putem Interneta.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33302	Izrada novog komunikacijskog sučelja prema bolnicama	MZSS, HZZO	5-2007	Provedeno
Provedba: Personalizirane su iskaznice zdravstveno osiguranih osoba - isprava 2, koje su multifunkcionalne pametne kartice i podijeljene ovlaštenim zaposlenicima bolnica koji sada izravno sigurnim načinom preko Interneta uz upotrebu pametne kartice dostavljaju podatke u HZZO.				
33303	Početak II.faze projekta informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite	MZSS, HZJZ,HZZO	6-2007	Provedeno
Provedba: Definirani su svi parametri za elektronički zdravstveni karton. Personalizirane su iskaznice zdravstveno osiguranih osoba - isprava 2 koje, su multifunkcionalne pametne kartice i podijeljene liječnicima i medicinskim sestrama. Karticama se osigurava sigurnost cjelokupnog informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite i u tijeku je povezivanje ordinacija opće/obiteljske medicine na središnji dio informatičkog sustava primarne zdravstvene zaštite.				
33304	Horizontalna integracija informacijskog sustava	MZSS, HZZO	9-2007	Provedeno
Provedba: U okviru informatizacije sustava primarne zdravstvene zaštite kao dodatna funkcionalnost u testni rad je puštena usluga kojom liječnik iz ordinacije izravno za svog pacijenta rezervira termin potrebnog specijalističkog pregleda.				

### 1.3.4 e–Obrazovanje

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33401	Uspostava StuDOM Centra potpore (sistemska potpora studentskim domovima)	MZOŠ, SRCE	3-2007	Provedeno
33402	Proširenje računalnog klastera Isabella	MZOŠ, SRCE	6-2007	Provedeno
33403	Implementacija programskog rješenja za sustav knjižničnog poslovanja i upravljanja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (Voyager)	MZOŠ, NSK	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: U tijeku je implementacija sustava u knjižnice u sustavu znanosti i visokih učilišta.				
33404	Projekt pametne iskaznice osoba u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	MZOŠ	9-2007	Provedeno
33405	Umrežavanje ustanova sustava obrazovanja u računalno-komunikacijsku mrežu CARNet i pristup Internetu	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33406	Opremanje osnovnih i srednjih škola računalnom i programskom opremom	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Informatička oprema isporučena.				
33407	Opremanje visokih učilišta računalnom i programskom opremom	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Informatička oprema isporučena.				
33408	Usluga autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava obrazovanja (AAI@EduHr)	MZOŠ, SRCE	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
33409	Proširenje i održavanje informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) – 100% obuhvat	MZOŠ, SRCE	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
33410	Održavanje i unapređenje integriranog financijsko-informacijskog sustava sveučilišta Republike Hrvatske	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
33411	Programska potpora integriranom poslovno informacijskom sustavu visokih učilišta	MZOŠ, Sveučilište u Zagrebu	12-2007	Provedeno
Provedba: Programska potpora ugovorena. Izvršenje ugovora u tijeku.				
33412	Održavanje sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u školstvu (e-Matica)	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
33413	Uspostavljanje infrastrukture za provođenje e-Mature	MZOŠ	12-2007	Provedeno
33414	Pristup bibliografskim on-line bazama i e-časopisima	MZOŠ, CARNet	Trajno	Provodi se
Provedba: Pristup omogućen svim članovima znanstvene zajednice.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33415	Uvođenje digitaliziranih interaktivnih obrazovnih sadržaja u školstvu (e-obrazovni sadržaji) – sadržaji 2 nova predmeta za 4 razreda srednjih škola	MZOŠ, AZOO, CARNet	12-2007	Provedeno
Provedba: U okviru portala Nikola Tesla, učenici srednjih škola imaju na raspolaganju interaktivne obrazovne sadržaje za predmete matematiku, fiziku i kemiju za sva 4 razreda srednje škole.				
33416	Održavanje sustava za upravljanje učenjem LMS	MZOŠ, CARNet	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
33417	Obrazovanje 6000 nastavnika osnovnih i srednjih škola u nastavi (ECDL)	MZOŠ	12-2007	Provedeno
Provedba: Proveden javni natječaj za usluge ECDL izobrazbe i certificiranja nastavnog kadra osnovnih i srednjih škola. Certificiranje u tijeku.				

### 1.3.5 e-Kultura

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33501	Izrada smjernica za planiranje, prijavu, provođenje i vrednovanje projekata digitalizacije arhivske knjižnične i muzejske građe	MK, NSK, HDA, MDC	10-2007	Provedeno
Provedba: Smjernice su završene, objava na portalu "Hrvatska kulturna baština" krajem veljače 2008. godine.				
33502	Uspostava centra za podršku projektima ustanova te informacijske i dokumentacijske baze centra za podršku	MK, NSK, HDA, MDC	7-2007	Provedeno
Provedba: Za potrebe uspostave centra za podršku osnovan je Odjel za digitalizaciju knjižnične, arhivske i muzejske građe pri MK.				
33503	Vrednovanje i odabir projekata digitalizacije	MK, NSK, HDA, MDC	11-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Prikupljene prijavnice za programe digitalizacije u 2008. godini rješavat će se tijekom veljače 2008. godine na Vijeću projekta obzirom na proračun za 2008. godinu.				
33504	Izrada normi i smjernica za digitalizaciju građe, oblikovanje, pohranu i pristup digitalnim zbirkama	MK, NSK, HDA, MDC	11-2007	Provedeno
Provedba: Smjernice su završene, objava na portalu "Hrvatska kulturna baština" krajem veljače 2008. godine.				

**1.3.6 e–Javna uprava**

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33601	Ažuriranje Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) u skladu s međunarodnom klasifikacijom NACE Rev.2 – NKD 2007	DZS	1-2007	Provedeno
33602	Prijava ID obrasca putem Interneta	MFIN PU, APIS IT	10-2007	Provedeno
33603	Prijava IDD obrazaca putem Interneta	MFIN PU, APIS IT	1-2008	Provedeno
33604	Strategija razvoja informacijskog sustava Carinske uprave	MFIN CURH, APIS IT	2-2007	Provedeno
Provedba: Usvojena strategija razvoja informacijskog sustava Carinske uprave.				
33605	Prijava poreza na dobit putem Interneta	MFIN PU, APIS IT	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Predlaže se promjena roka provedbe na ožujak 2008.				
33606	Razvoj modula za ciljano prikupljanje sadržaja dubinskog weba	HIDRA	3-2007	Provedeno
Provedba: Pobrano 15721 dokument i pohranjeno u DAMIR				
33607	Uspostava sustava za upravljanje Programom središnjeg portala državne uprave	SDUeH	4-2007	Provedeno
33608	Povezivanje matičnih ureda u HITRONet	SDUU, SDUeH, FINA	4-2007	Provedeno
Provedba: Sve lokacije spojene osim matičnih ureda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji su izvan sjedišta Ureda i izvan ispostava. Povezan je i APIS na SDUU jednim računalom.				
33609	Elektronička razmjena podataka u robnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije	MFIN CURH, APIS IT	6-2007	Provedeno
Provedba: Izgrađeni i upogonjeni servisi za razmjenu podataka u robnom prometu na graničnim prijelazima s Republikom Slovenijom.				
33610	Izrada infrastrukture središnjeg portala državne uprave za potrebe prve faze	SDUeH, APIS IT	6-2007	Provedeno
33611	Razvrstavanje jedinica Registra poslovnih subjekata (RPS) prema NKD 2007 i slanje obavijesti	DZS	12-2008	Provodi se
Provedba: Uglavnom provedeno. Sve jedinice bit će razvrstane do 15.2.2008. Za slanje obavijesti nisu osigurana sredstva u proračunu.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33612	Ostvariti povezivanje ODI s referentnim bazama podataka koje su u nadležnosti Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa	SDUUDI, APIS IT	6-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Provedba mjere ovisi o završetku zajedničkog informacijskog sustava Ministarstva pravosuđa i DGU-a. Predlaže se produljenje roka provedbe na 2009. godinu.				
33613	Dovršenje indeksiranja korpusa od cca 10.000 propisa Republike Hrvatske	HIDRA	6-2007	Provedeno
Provedba: Korpus se koristi za strojno učenje automatskog indeksiranja.				
33614	Dovršenje konverzije tekstova propisa Republike Hrvatske iz HTML formata u XML format i pridruživanje deskriptora iz bibliografske baze podataka	HIDRA	6-2007	Provedeno
Provedba: Konverzija je automatizirana.				
33615	Izrada plana za informatičko obrazovanje službenika i namještenika u državnoj upravi – ECDL	SDUU, SDUeH	6-2007	Provedeno
Provedba: Provedena je procjena potreba izobrazbe za 2008. godinu za državne službenike. Procjenu potreba pripremio je Odjel za planiranje, razvoj i upravljanje kadrovima u državnoj službi - Odsjek za razvoj kadrova.				
33616	Formiranje središnjeg repozitorija podataka osobnih stanja građana u SDUU	SDUU	6-2007	Provedeno
Provedba: Središnji repozitorij postoji na dvije lokacije - SDUU za dio RH bez Grada Zagreba, te APIS-IT za Zagreb te dio Zagrebačke županije. Još nedostaju matice Dubrovačko-neretvanske županije.				
33617	Uspostava organizacije i priprema sadržaja prve faze izrade središnjeg portala državne uprave	SDUeH, APIS IT, Sva TDU	9-2007	Provedeno
Provedba: Portal Mojauprava.hr javno je objavljen u listopadu 2007. godine. Portal je dobio nagradu Vidi Web Top 100 za najbolju hrvatsku internetsku stranicu u kategoriji Vladine organizacije i državne institucije za 2007. godinu.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33618	Rad na donošenju hrvatskih normi Open Document Format i Portable Data Format kao podloge za razmjenu elektroničkih isprava u radu tijela državne uprave	SDUeH, APIS IT	12-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>U HZN/TO Z1 je 2007. godine pokrenut postupak za prihvaćanje međunarodne norme ISO/IEC 26300:2006 Information technology -- Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ODF) kao hrvatske, u izvorniku na engleskome jeziku, uz prijevod naslova norme na hrvatski. Na 9. sastanku HZN/TO Z1 prijedlog je jednoglasno i upućen u daljnji postupak. Odluka o prihvaćanju objavljena je u Glasniku HZN broj 5/2007 iz listopada 2007. godine s danim rokom za javnu raspravu od 30 dana. O roku je stigla jedna primjedba o kojoj će TO raspravljati na sljedećem sastanku HZN/TO Z1.</p> <p>Na sastanku HZN/TO Z1 zaključeno je da prihvaćanje međunarodne norme ISO 19005-1:2005 Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) nije u opsegu rada ovog TO te je, uz suglasnost HZN, zahtjev za prihvaćanjem ove norme kao hrvatske proslijeđen nadležnom TO.</p>				
33619	Izrada priručnika za uporabu Open Office proizvoda te Open Desktop rješenja za potrebe tijela državne uprave i odgojno-obrazovnih ustanova	SDUeH, MZOŠ, APIS IT	11-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>SDUeH je obavio pregled postojeće dokumentacijske građe za obuku korisnika OpenOffice računalnog programskog sustava za standardne radnje sa dokumentima u tijelima državne uprave. Kao podloga metodološkog oblikovanja sadržaja preuzet je normirani obrazac sadržaja za potvrđivanje osnovnih znanja i vještina u radu s računalima i računalnim programima po strukturi ECDL (European Computer Driving Licence) modela. SDUeH je u suradnji s udrugom HrOpen izradio priručnik za standardne OpenOffice module po osnovnoj specifikaciji ECDL modela. Priručnici su publicirani po modelu Creative Commons licence kao otvorenog modela uporabe i dorade izrađenih materijala koji su javno dostupni i u elektroničkom obliku.</p>				
33620	Izrada hrvatskog sučelja (lokalizacija) Open Office programskog okruženja za potrebe tijela državne uprave te provedbu programa dostupnosti (distribucije) tog proizvoda u tijelima državne uprave te za provedbu projekta uvođenja otvorenih programskih rješenja u obrazovnu zajednicu	SDUeH, APIS IT, CARNet	9-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Hrvatsko sučelje (lokalizacija) OpenOffice programskog sustava izvršena je u potpunosti i odnosi se na verziju 2.2.1 iz lipnja 2007. godine. Kako se u 2007. godini objavila dorađena verzija OpenOffice.org sustava 2.3, to se pristupilo lokalizaciji konačne verzije ovog proizvoda. Time se OpenOffice.org programski sustav potpuno ravnopravno pojavljuje kao rješenje za uporabu računalnih sustava u obradi uredskih dokumenata tijela državne uprave. Nekoliko tijela državne uprave preuzela su u potpunosti OpenOffice sustav kao prihvatljivo rješenje za njihove svakodnevne potrebe i u praksi se potvrđuju kao pozitivno iskustvo za naredne aktivnosti u području distribucije i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom.</p>				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33621	Prijava IP obrasca putem Interneta	MFIN PU, APIS IT	1-2008	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: U funkciji je dostava podataka na CD, DVD ili FDD. Predlaže se promjena roka provedbe na siječanj 2009.				
33622	Izrada protokola za nadogradnju ODI	SDUUDI, APIS IT	10-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Predlaže se produljenje roka provedbe na 2009. godinu.				
33623	Izrada analize državne imovine i predložka za ocjenjivanje svake jedinice imovine	SDUUDI, APIS IT	10-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: U tijeku je analiza državne imovine. Predlaže se produljenje roka provedbe na 2008. godinu.				
33624	Izmjena Zakona o NKD-u	DZS	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Nositelj za izmjenu Zakona o NKD-u kao i prijedlog Zakona o RPS-u je Fina stoga se predlaže promjena nositelja mjere. Prema informacijama iz Fine, provedbe mjere kasni radi neusuglašavanja teksta Nacrta prijedloga zakona između Fine, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva pravosuđa i Trgovačkog suda u Zagrebu.				
33625	Prijedlog Zakona o RPS-u	MP, FINA, DZS	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Zakon o Registru poslovnih subjekata (RPS) je u nacrtu. Očekuje se njegovo stupanje na snagu 1. lipnja 2008. godine. Predlaže se produljenje roka provedbe na svibanj 2008. godine.				
33626	Priprema za prijenos vođenja Registra poslovnih subjekata u Financijsku agenciju	FINA	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Preduvjet za provođenje mjere je završetak mjere usvajanja Zakona o Registru poslovnih subjekata (RPS) s rokom provođenja prosinac 2007. Po ispunjenju preduvjeta FINA je spremna od DZS-a preuzeti vođenje poslovnih subjekata u opsegu u kojem to sada radi DZS.				
33627	Prijava poreza na dohodak putem Interneta	MFIN PU, APIS IT	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Zbog nedefiniranog zakonskog rješenja za pitanje priloga prijavi, čeka se na primjenu ove usluge. Predlaže se promjena roka provedbe na siječanj 2009. godine.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33628	Novi računalno podržani sustav provoza (New Computerised Transit System – NCTS)	MFIN CURH, APIS IT	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Projekt se provodi prema PHARE procedurama koje uključuju upravljanje i nadzor Europske komisije pri čemu Carinska uprava nema utjecaja na rokove donošenja odluka u određenim fazama projekta.				
33629	Sustav razmjene podataka o trošarinama (System for the Exchange of Excise Data - SEED)	MFIN CURH, APIS IT	12-2007	Provedeno
Provedba: Izgrađena aplikacija, spremna za uporabu.				
33630	Priprema korpusa za selekciju i ekstrakciju statističkih asocijata deskriptora Eurovoca	HIDRA	9-2007	Provedeno
Provedba: Implementacija u proces rada Hidre u tijeku.				
33631	Uspostava servisa za eksperimentalno pretraživanje Eurovoca obogaćenog asocijatima	HIDRA	12-2007	Provedeno
Provedba: Model napravljen, implementacija čeka cjelokupnu reorganizaciju Hidrinog weba.				
33632	Izrada preporuka u svrhu standardizacije službenog web prostora i dokumenata te pokretanje inicijative dodjele jedinstvene identifikacije dokumenata u procesu njihovog donošenja	HIDRA, SDUeH	12-2007	Provedeno
Provedba: Provodi se u skladu s izgradnjom portala Moja uprava, meta podaci definirani, s primjenom će se nastaviti u 2008. godini.				
33633	Revizija podataka formalne i sadržajne obrade te klasifikacija cjelokupne građe prema područjima djelatnosti tijela javne vlasti, a usklađenih pravnih propisa RH s pravnom stečevinom EU-a prema poglavljima pregovora za članstvo RH u EU	HIDRA	12-2007	Provedeno
Provedba: Klasificirani su propisi RH i ostala građa na razini zbirki pojedinih tijela javne vlasti.				
33634	Razvoj, instalacija i korištenje unapređenog sustava za pobiranje mrežnih sadržaja	HIDRA	10-2007	Provedeno
Provedba: Sustav se koristi u radnom procesu Hidre.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33635	Razvoj modula za pretraživanje DAMIR-a po punom tekstu odabranih sadržaja	HIDRA	12-2007	Provedeno
Provedba: Modul je razvijen i u pripremi za objavu na webu Hidre.				
33636	Uspostava modula za online prikupljanje podataka o online izvorima podataka suradnjom s tijelima javne vlasti	HIDRA, SDUeH	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Uspostavljeno je online prikupljanje podataka o tijelima javne vlasti za potrebe adresara, iskustva će biti temelj za daljnja prikupljanja podataka, za sada se prikupljanje obavilo izravnom komunikacijom s tijelima putem e-pošte.				
33637	Formalna klasifikacija online izvora i usluga tijela javne vlasti prema tipu izvora informacija, sadržajna po područjima djelatnosti odgovornih tijela javne vlasti te izrada prikaza podataka prema tim kategorijama	HIDRA, SDUeH	9-2007	Provedeno
Provedba: Formalna klasifikacija pripremljena, sadržajna djelomično obavljena, priprema za prikaz podataka na webu po područjima djelatnosti pripremljena i u tijeku je provedba.				
33638	Selekcija oko 10.000 dokumenata tijela javne vlasti (prikupljenih i pohranjenih u DAMIR-u) i daljnje stvaranje korpusa tekstova za strojno učenje indeksiranja	HIDRA	6-2007	Provedeno
Provedba: Analiza je pokazala nepouzdanost konverzije dokumenata u PDF formatu u HTML format na razini dijakritičkih znakova hrvatske abecede, korpus će se do daljnjega popunjavati HTML dokumentima.				
33639	Rad na algoritmima strojnog učenja za automatsku klasifikaciju i indeksiranje dokumenata	HIDRA	12-2007	Provedeno
Provedba: Algoritmi se trajno optimiraju, objavljuju se na znanstvenim i stručnim konferencijama odnosno objavljuju u časopisima.				
33640	Markiranje kolokacija u korpusu tekstova u svrhu optimizacije algoritama za jezičnu obradu dokumenata	HIDRA	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Očekuje se dovršavanje u prvom kvartalu 2008 godine, kadrovski problemi. Predlaže se promjena roka provedbe na ožujak 2008. godine.				
33641	Implementacija prve verzije automatskog indeksiranja u radnu stanicu za računalom potpomognuto indeksiranje	HIDRA, SDUeH	12-2007	Provedeno
Provedba: Napravljen je automat koji predlaže deskriptore kao sadržajne odrednice, javno dostupan online program u tijeku izrade.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33642	Restauracija Web izvora tijela državne uprave i njihovo usklađivanje s općim načelima pristupa i uporabe online informacijskih sadržaja	SDUeH, APIS IT, HIDRA	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
<p>Provedba:</p> <p>U okviru provedbe programa portala Moja uprava uspostavljena je pilot infrastruktura za upravljanje sadržajem i njegovu prezentaciju, te identificirane potrebe za izgradnjom nove stalne infrastrukture. U okviru priprema tehničkih i funkcionalnih specifikacija za novu portalsku infrastrukturu izradit će se i preporuke za načela pristupa i uporabe online informacijskih sadržaja.</p>				
33643	Priprema i probno ugrađivanje Open Desktop rješenja u tijela državne uprave	SDUeH, APIS IT	12-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>SDUeH izvršio je uvid u postojeću praksu uporabe Open Desktop rješenja kao i odgovarajuća iskustva u okruženja javne uprave. Sukladno dobivenim saznanjima pristupilo se pojedinačnim postupcima probnog korištenja u nekoliko TDU. Kao ciljano rješenje utvrđeno je prihvatiti cjelovite, grafički orijentirane i komunikacijski podržane programske platforme. Rezultati korištenja kao i pozitivna iskustva te preporuka dobivene kroz uporabu Open Desktop sustava u zemljama Europske unije podloga su izrade modela uvođenja cjelovitog desktop sustava koji se u radnom okruženju počeo primjenjivati krajem 2007. godine. te se planira njegovo probno korištenje u TDU tijekom 2008. godine.</p>				
33644	Oblikovanje i priprema postupka donošenja preporuke za uporabu Open Office u tijelima državne uprave odnosno u odgojno-obrazovnim ustanovama	SDUeH, APIS IT, MZOŠ	12-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Prije donošenja prijedloga Preporuke, izvršen je uvid i istraživanje sustava otvorenih normi oblikovanja digitalnog zapisa dokumenata u uredskom radu tijela državne uprave te je utvrđen polazni normirani obrazac temeljen na otvorenim modelima normizacije. SDUeH je uputio Hrvatskom zavodu za norme prijedlog za objavljivanje međunarodne norme za digitalni zapis uredskih dokumenata u računalnim sustavima - ISO/IEC 26300:2006 (Open Document Format for Office Applications) kao hrvatske norme. Također je upućen i prijedlog objavljivanja otvorene norme ISO/IEC 19005-1:2005 (Electronic document file format for long term preservation) kao hrvatske norme. Međutim, nadležni Tehnički odbor koji je imao preuzeti prijedlog, prihvatiti ga i prosljediti na javnu raspravu te objaviti nije pravovremeno proveo sve radnje te se rokovi objavljivanja ovih normi moraju prenijeti u 2008. godinu.</p>				
33645	Uspostava informacijskog sustava pomorskog prometa	MMTPR	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
<p>Provedba:</p> <p>Provodi se realizacija Informacijskog sustava pomorskog prometa.</p>				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33646	Pripremiti Projekt izrade baze podataka za plovni put Dunav	MMTPR	12-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Izrada baze podataka o plovnom putu rijeke Dunav provodi se u okviru međunarodnog Interreg III B projekta "Data warehouse for Danube waterway - D4D" u okviru međunarodne radne grupe "GIS Forum Danube" sa zajedničkim ciljem utvrđivanja načina prikupljanja, obrade i razmjene podataka o plovnom putu između podunavskih zemalja.</p> <p>Realizirano u 2007 godini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podloga za konceptualni model podataka o trupu plovila</li> <li>- podloga za buduću bazu minimalnih podataka o plovilima</li> <li>- prijedlog kodiranja lokacija na vodnom putu rijeke Dunav i Drave, te relevantne informacije potrebne kod njihove prijave kod UN/LOCODE</li> <li>- prijedlog kodiranja lokacija na vodnom putu rijeke Save</li> <li>- podloge za određivanje ENI brojeva i nacionalnih brojeva za plovila unutarnje plovidbe u RH</li> <li>- prijedlog forme za upis podataka o plovilima u sustav Access (zbog kasnije međunarodne razmjene)</li> <li>- prikupljanje i obrada podataka o plovilima registriranim u Lučkim kapetanijama Vukovar, Osijek, Sl. Brod i Sisak.</li> </ul> <p>Završetak projekta D4D prosinac 2007. godine.</p>				
33647	Informacijski sustav praćenja i razvoja programa poticanja u turizmu	MMTPR	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
<p>Provedba:</p> <p>Predlaže se promjena roka provedbe na prosinac 2008. godine.</p>				
33648	Informacijski sustav praćenja i razvoja programa kategorizacije ugostiteljskih objekata	MMTPR	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
<p>Provedba:</p> <p>Predlaže se promjena roka provedbe na prosinac 2008. godine.</p>				
33649	Informatizacija upisnika/registara i dizajniranje cjelovitih informacijskih sustava u MPRRR	MPŠVG	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
<p>Provedba:</p> <p>U tijeku je projekt kojeg financira Svjetska banka "Procjena potreba i tehnička specifikacije za razvoj IS Ministarstva i odgovarajućeg Data centra". Opći cilj projekta je: stvaranje odgovarajuće okoline informacijsko komunikacijske tehnologije u Ministarstvu, kako bi se poboljšala operativna učinkovitost Ministarstva i uspostavila ICT kao potpora odlučivanju.</p>				
33650	Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom – faza 2	MUP	12-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Oprema je instalirana prema planu na 7 graničnih prijelaza i to na graničnim prijelazima Županja, Stara Gradiška, Karasovići, Zračna luka Split, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, GP Gunja. Sustav je u fazi testiranja.</p>				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33651	Pilot projekt prebacivanja aplikacije Knjiga državljana na web platformu	SDUU	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Web aplikacija je pripremljena, ali nije implementirana.				
33652	Geoportal objava na Internetu	DGU	10-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Nije definiran modalitet kartične naplate i vl. prihoda, te se predlaže produljenje roka provedbe na lipanj 2008. godine.				
33653	Uskladiti sadržaje na Internetu s WCAG 1.0	sva TDU	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Tijekom 2007. godine od 26 središnjih tijela državne uprave 9 tijela je sadržaje na Internetu je uskladilo s WCAG 1.0. Dok je preostalih 16 tijela tražilo produljenje roka provedbe mjere, a SDUU je predložio organiziranje edukacije. Šest tijela je u postupku redizajna svojih internetskih stranica u okviru kojeg predviđaju i usklađenost s WCAG 1.0 standardom.				
33654	Implementirati i učiniti dostupnim demonstratore e-Javnih usluga	TDU koja pružaju usluge na razini 4	12-2007	Provedeno
Provedba: Mjera je djelomično provedena. Obzirom da provedba zahtjeva dodatna financijska sredstva dinamika provedbe će se uskladiti s Državnim proračunom za 2008. godinu.				
33655	Održavanje i razvoj digitalno-komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNet	MUP	Trajno	Provodi se
Provedba: U funkciji su 82 bazne stanice od ukupno 110. Ukupno je korisnicima isporučeno 4207 ručnih radio stanica te 1772 kolskih i stacionarnih radio stanica, što ukupno čini 5979 radio uređaja. Pored toga je preprogramirano na novi TETRA sustav i pušteno u rad 70 ručnih i 135 mobilnih radio uređaja za potrebe Hitne pomoći grada Zagreba. Sustav TETRA je u funkciji na područjima policijskih uprava: dubrovačko-neretvanske, splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske, zadarske, ličko-senjske, primorsko-goranske, istarske, karlovačke, zagrebačke, varaždinske i međimurske, a na ostalom teritoriju ostvarena je djelomična pokrivenost. U pripremi je instalacija preostalih baznih postaja, te se do kraja 2008. godine očekuje završetak radova i cjelokupna pokrivenost Republike Hrvatske.				
33656	Kontinuirano prikupljanje i odabir sadržaja sa web sjedišta	HIDRA	Trajno	Provodi se
Provedba: Prikupljeno 147529 dokumenata, odabrano i objavljeno 25372 dokumenta.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33657	Proširenje i nadogradnja aplikacijskog sustava za vođenje upisnika i evidencija (eRegistri), jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva te sustava za prikupljanje podataka putem strukturiranih web obrazaca (eObrasci)	MZOŠ	12-2007	Provedeno
Provedba: Sustavi eRegistri i eObrasci su u testnoj fazi. Predlaže se promjena roka provedbe u Trajno.				
33658	Razvoj infrastrukture središnjeg portala državne uprave	SDUeH, APIS IT	Trajno	Provodi se
33659	Kontinuirana prilagodba funkcionalnosti i sustava realizacije središnjeg portala državne uprave	SDUeH, APIS IT, Sva TDU	Trajno	Provodi se
33660	Provedba obuke trenera za izvođenje programa osposobljavanja primjenom ECDL obrasca provjere usvojenih znanja i vještina	SDUU, SDUeH	Trajno	Provodi se
Provedba: Treneri prolaze trening za provedbu seminara u SDUU, te za polaganje ispita u HIZ-u. Seminari su vrlo traženi, a angažirani treneri odlično ocjenjivani.				
33661	Projekti interoperabilnosti i interkonektivnosti carinskih informacijskih sustava s Europskom unijom	MFIN CURH, APIS IT	Trajno	Provodi se
Provedba: Projekti se provode prema PHARE procedurama čiji plan provedbe se bazira na višegodišnjoj osnovi.				
33662	Izgradnja sustava interoperabilnosti tijela državne uprave	SDUeH, APIS IT	Trajno	Provodi se
Provedba: U okviru programa portala Moja uprava izrađen je dokument kojim je definiran standard metapodataka za opisivanje dokumenata.				
33663	Ugrađivanje i održavanje informacijskih sadržaja o Open Desktop, Open Office i srodnim rješenjima te hrvatskim i međunarodnim normama na portalu e-Hrvatska	SDUeH, APIS IT	Trajno	Provodi se
Provedba: U izvještajnom razdoblju utvrđena su polazišta i okviri strukture i sadržaja informativne i distribucijske točke u domeni otvorenih sustava za potrebe tijela državne uprave što predstavlja izuzetno opsežan i dinamičan skup sadržaja budući da se sustavi otvorenih programa i otvorenih normi različito distribuiraju što otežava postupke održavanja i distribucije sadržaja. Utvrđeno je da se provedba može izvoditi kroz informativnu točku e-Hrvatska (SDUeH) ili mojaUprava (APIS IT) odnosno kroz izdvojenu lokaciju po modelu FLOSS zajednice u suradnji sa strukovnom udrugom za otvorene sustave HrOpen, sa kojom se planira u 2008. godini pristupiti inicijalnoj distribuciji osnovnih sadržaja. SDUeH je napravio distribuciju osnovnih sadržaja iz domene otvorenih sustava u okviru TELEACCESS projekta koji se provodi u okviru INTTERREG IIIB CADSES programa.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DHMZ	Trajno	Provodi se
Provedba: Nabavljena oprema i programska podrška za računovodstvo (komunikacija s riznicom), uspostavljena mreža automatskih hidroloških postaja, sve ključne lokacije povezane u DataVPN).				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DGU	Trajno	Provodi se
Provedba: Nabava IKT obavljena u skladu s planom.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DI	Trajno	Provodi se
Provedba: Povećava se kapacitet mreže kao i broj umreženih lokacija.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DZM	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DZNS	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DZS	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DZZZ	Trajno	Provodi se
Provedba: Nabavljeno osobno računalo, dva prijenosnika kao donacija, oprema za provedbu ECURIE sporazuma, započela izrada WEB aplikacije za unos podataka o pronađenim izvorima na granici (regionalni sporazum).				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MINGORP	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MK	Trajno	Provodi se
Provedba: Tijekom 2007. uspostavljena mrežna infrastruktura između svih lokacija, te dovršeni i projekti GIS-a nacionalnih i parkova prirode.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MORH	Trajno	Provodi se
Provedba: Na temelju korisničkih zahtjeva, uobličeni u Zahtjeve za nabavu, te strategijskih dokumenata (Dugoročni plan razvoja OS RH 2006.-2015. godina i Provedbeni plan strateških komunikacijskih mreža i informatizacija MO i OS RH), ova mjera predstavlja trajnu zadaću u smislu modernizacije i znavljanja sklopovske i mrežne opreme te programske potpore. Osim navedenog, pokrenut je i postupak nabave za ugovaranje izrade Jedinstvenog informacijskog sustava MO i OS RH.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MOBMS	Trajno	Provodi se

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MPŠVG	Trajno	Provodi se
Provedba: Nabavljena oprema,dizajnirane nove i osigurano održavanje za sve postojeće aplikacije (sustave). U tijeku poboljšanje lokalne mrežne infrastrukture te poboljšanje veza s udaljenim korisnicima. U postupku je dizajn i izgradnja cjelovitog Data centra Ministarstva.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MUP	Trajno	Provodi se
Provedba: Kontinuirano se provodi nabava informatičke opreme za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MVPEI	Trajno	Provodi se
Provedba: MVPEI trajno ulaže u vlastitu informacijsku infrastrukturu prema zahtjevima informacijskih sustava koji se službeno koriste u MVPEI sukladno potrebama službe. Sustav IKOS (Informacijsko komunikacijski sustav) najznačajniji je sustav MVPEI, koji obuhvaća podsustav političke dokumentacije te podsustav konzularnog poslovanja (putovnice i vize). Sukladno preuzetim obvezama RH iz pregovora s EU, a koje se odnose na vizni režim RH, odnosno stvaranje Nacionalne baze podataka o vizama, Sustav se kontinuirano prilagođava zahtjevima, razvija i održava. Do sada je uveden na svim europskim lokacijama DM/KU, te u Sjevernoj Americi, Izraelu, JAR-u, Maroku, Indiji, Kini, Maleziji, Indoneziji i Japanu. Nastavlja se ispunjavanje prihvaćenog Plana uvođenja Sustava IKOS koji treba završiti s prvom fazom implementacije na lokacijama DM/KU do 30. rujna 2008. godine. Pored Sustava IKOS trajno se ulaže i u ostale informacijske sustave potpore (kadrovski, financijski sustav i sustav uredskog poslovanja).				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MZOPUG	Trajno	Provodi se
Provedba: Nakon nabave potrebnog hardvera za konsolidaciju domene, AD-a i e-mail sustava, kreće se u projekt konsolidacije informatičkog sustava.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MZSS	Trajno	Provodi se
Provedba: Ulaganje u održavanje i razvoj provodi se kontinuirano. U 2007. godini ulagalo se u nabavu informatičke opreme i systemske programske podrške, informatičku edukaciju djelatnika, informatizaciju primarne zdravstvene zaštite, informatizaciju sustava socijalne skrbi – Svjetska banka, nabavu programskih (aplikativnih) rješenja, nadogradnja i održavanje postojeće informatičke infrastrukture (računalna oprema, mrežna infrastruktura, systemsko održavanje i programska rješenja).				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MMPI	Trajno	Provodi se
Provedba: MMPI kontinuirano ulaže u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture, te je u protekloj godini u konsolidaciju mrežne infrastrukture uloženo 241.218,00 kn s PDV-om, dok sredstva uložena u održavanje informatičke infrastrukture iznose 528.000,00 kn.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MFIN	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MZOŠ	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti se provode po planu.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	MP	Trajno	Provodi se
Provedba: Aktivnosti teku prema godišnjem planu održavanja i unaprjeđenja računalno-komunikacijske infrastrukture pravosuđa.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DZIV	Trajno	Provodi se
Provedba: Povećanje brzine pristupa Internetu sa 4 na 10 Mbit/s. Instaliran Sharepoint server (implementacija u tijeku). Standardno održavanje i proširenje ICT infrastrukture.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	SDURF	Trajno	Provodi se
Provedba: Nabavljena nova informatička oprema za korisnike.				
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	SDUeH	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	SDUU	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	SDUUDI	Trajno	Provodi se
33664	Ulaganje u održavanje i razvoj vlastite informacijske infrastrukture	DUZS	Trajno	Provodi se
Provedba: U tijeku je izgradnja LAN-ova u glavnim područnim uredima koji bi mogli biti umreženi preko HITRONeta.				

#### 1.4 Praćenje pokazatelja razvoja informacijskog društva

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
34001	Projekti uspostavljanja istraživanja o informacijskom društvu (IKT-a) u okviru PHARE Multi-Beneficiary Statistical Co-operation Programme 2005 (3 projekta)	DZS	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Kašnjenje u uspostavi istraživanja IKT-a radi kompliciranih administrativnih procedura DZS-a u korištenju fondova mb PHARE 2005. Predlaže se promjena roka provedbe ne ožujak 2008. godine.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
34002	Studija dostupnosti javnih usluga na Internetu u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu	SDUeH	3-2007	Provedeno
Provedba: Studija je objavljena na internetskim stranicama SDUeH.				
34003	Ugovaranje izrade Studije dostupnosti javnih usluga na Internetu u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu	SDUeH	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Studiju nije bilo moguće ugovoriti u okviru privremenog financiranja za 2008. godinu.				
34004	Studija stanja razvoja informacijskog društva	SDUeH	12-2007	Nužno produljenje roka provedbe
Provedba: Mjera je povezana s provedbom mjere 34001 DZS-a. Predlaže se promjena roka provedbe na lipanj 2008. godine.				

### 1.5 Međunarodna suradnja

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
35001	Izrada Pregovaračkog stajališta za poglavlje 10. Informacijsko društvo i mediji	SDUeH, MMTPR, MK	3-2007	Provedeno
Provedba: 9. ožujka 2007. godine pregovaračko stajalište je upućeno njemačkom Predsjedništvu Vijeća EU i Tajništvu Vijeća EU.				
35002	Otvaranje pregovora o Poglavlju 10. Informacijsko društvo i mediji	SDUeH, MMTPR, MK	6-2007	Provedeno
Provedba: 26. lipnja 2007. godine je službeno otvoreno predmetno poglavlje na MVK na razini voditelja izaslanstava. RH je zaprimila tri mjerila za zatvaranje poglavlja.				
35003	Stupanje na snagu Memoranduma o razumijevanju o sudjelovanju Hrvatske u programu IDABC	SDUeH	3-2007	Provedeno
Provedba: Memorandum o razumijevanju stupio je na snagu 13. ožujka 2007. godine.				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
35004	Zaključak o određivanju prioriternih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja	SDURF	12-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine usvojila Zaključak o određivanju prioriternih programa Europske zajednice za koje će RH pokrenuti postupak pristupanja tijekom 2007. te 2008. godine, kako bi se omogućilo sudjelovanje u navedenim programima tijekom razdoblja 2007.-2013.</p> <p>Točkom 2. Zaključka Vlade određena su tijela državne uprave koja su zadužena za pokretanje pregovora i sklapanje Memoranduma o suglasnosti za svaki pojedini program. Navedena tijela državne uprave najprije podnose formalni zahtjev za sudjelovanje u programu. Potom slijede pregovori i utvrđivanje godišnjeg financijskog doprinosa kandidatkinja za pokrivanje punih troškova sudjelovanja u programu te zaključivanje sporazuma.</p> <p>Do 18. listopada 2007. godine potpisani su Memorandumima o razumijevanju (MoU) za 6 programa zajednice (ukupno je potpisano 8 MoU jer su potpisane dvije od tri komponente CIP-a): Culture 2007, VII Framework Programme, PROGRESS, Europe for Citizens, EIP, ICT, Intelligent Energy Europe te Civil Protection Financial Instrument.</p> <p>U Hrvatskom Saboru ratificirano je 4 MoU: Culture 2007, VII Framework Programme, Europe for Citizens te Intelligent Energy Europe.</p> <p>Odustalo se od sudjelovanja u programu eContent Plus (MZOŠ) te će se u programu Pericles vjerojatno sudjelovati u statusu treće zemlje.</p>				
35005	Organizacija sastanka radnih skupina za eSEE i bSEE	MMTPR, SDUeH	5-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>Predstavnici MMPI aktivno sudjeluju u radu eSEE Inicijative i bSEE Taskforce u okviru Pakta o Stabilnosti (Hrvatska je predsjedavala radnom skupinom bSEE u jednogodišnjem mandatu do svibnja 2007. godine), te aktivno podržava razvoj širokopojsnog pristupa u regiji. U sklopu Međunarodne konferencije MIPRO u Opatiji (21-25. svibnja 2007.), u organizaciji Ministarstva održana je zasebna Međunarodna konferencija "Broadband Day", na kojoj su svi sudionici (113 sudionika iz 12 zemalja), posebno sudionici iz SEE regije, imali priliku upoznati sa dosadašnjim postignućima u razvoju, te budućim planovima na Hrvatskom tržištu širokopojsnog pristupa, kao i sa iskustvima razvijenih tržišta širokopojsnog pristupa (Francuska).</p>				
35006	Sudjelovanje u radu Ministarske konferencije ministara zaduženih za razvoj informacijskog društva u jugoistočnoj Europi	SDUeH, MMTPR	10-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>RH je dana 29. listopada 2007. godine potpisala eSEE Agendu Plus za razvoj informacijskog društva u JIE.</p>				
35007	World Summit Award Grand Jury 2007	SDUeH	10-2007	Provedeno
<p>Provedba:</p> <p>WSA Grand Jury održan je 1. - 9. rujna 2007. godine na Brijunima.</p>				

ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
35008	Sudjelovanje u radu bSEE inicijative u okviru Pakta o Stabilnosti	MMTPR	Trajno	Provodi se
<p>Provedba:</p> <p>MMPI aktivno sudjeluje u radu bSEE inicijative i to na način da smo u jednogodišnjem mandatu koordinirali rad bSEE-a (do 25.05.2007.) i sudjelovali u izradi Akcijskog plana bSEE. Posebno ističemo organizaciju međunarodne konferencije "Broadband Day" u Opatiji 22.5.2007. (113 učesnika iz 12 zemalja) s čime je Hrvatska ispunila mjeru iz Akcijskog plana bSEE-a koja se odnosi na organiziranje radionice na temu razvoja širokopolasnog pristupa. Predstavnici ministarstva aktivno sudjeluju na svim sastancima radne skupine, tri u 2007. (Beč, 31.01., Opatija, 25.05., Skoplje 27.09.).</p>				
35009	Sudjelovanje u radu eSEE inicijative u okviru Pakta o Stabilnosti	SDUeH	Trajno	Provodi se
<p>Provedba:</p> <p>RH je dana 29. listopada 2007. godine potpisala eSEE Agendu Plus za razvoj informacijskog društva u JIE. Predstavnici SDUeH sudjeluju u radu eSEE inicijative u okviru Pakta o Stabilnosti. Dr.sc. Diana Šimić, zamjenica državnog tajnika SDUeH imenovana je predsjedateljicom eSEE Inicijative.</p>				
35010	Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima u vezi digitalne televizije	MMTPR, MK, HAT, VEM	Trajno	Provodi se
<p>Provedba:</p> <p>Predstavnici MMPI i HAT su od 6. do 7. prosinca 2007. sudjelovali na seminaru «Frequency Planning for Digital Broadcasting» u organizaciji EBU-a.</p>				
35011	Aktivno sudjelovanje u međunarodnim telekomunikacijskim organizacijama (ITU, CEPT, ETSI)	MMTPR, HAT	Trajno	Provodi se
<p>Provedba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treći forum o monitoringu tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga u jugoistočnoj Europi, Sofija, 24.-26. 01. 2007.</li> <li>- UMTS &amp; GSM Svjetski kongres, Barcelona, 12.-13.02.2007.</li> <li>- Odbor CCPC/EAPC NATO Saveza, Bruxelles, 15.-16.04.2007.</li> <li>- Međunarodni forum o telekomunikacijskim uslugama, Prag, 17.-20.04.2007</li> <li>- Godišnja skupština CEPT-a za 2007. godinu, Amsterdam, 19.-21.06.2007.</li> <li>- Četvrti sastanak visokih predstavnika uprava za elektroničke komunikacije, Bruxelles, 27.06.2007.</li> <li>- Sudjelovanje na Regionalnoj Ministarskoj konferenciji za informacijsko društvo, Sarajevo, 29.-30.10.2007.</li> <li>- Plenarno zasjedanje odbora CCPC/EAPC NATO Saveza, Bruxelles, 20.-24.10.2007.</li> <li>- Svjetska radiokomunikacijska konferencija (ITU-WRC 07), Geneva, 22.10 - 16.11.2007.</li> <li>- Četvrti forum o monitoringu tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga u jugoistočnoj Europi, Istanbul, 8.-9.11.2007.</li> <li>- Peti sastanak visokih predstavnika uprava za elektroničke komunikacije, Bruxelles, 22.11.2007. godine.</li> </ul>				

## 1.6 Mehanizmi provedbe


ID	Mjera	Nositelji	Rok provedbe	Status
40001	Izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća	Sva TDU, HGK	1-2008	Provedeno
40002	Poslovi tajništva Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo	SDUeH	Trajno	Provodi se
Provedba: 22. siječnja 2007. godine održana je 2. sjednica NVID, a 14. rujna 2007. godine održana je 3. sjednica NVID.				

## 2 Razina informatiziranosti usluga

Prema Bangemannovom izvještaju razine informatiziranosti se mjere na skali od 0 do 4. Praćenje razvoja elektroničkih usluga u Europskoj uniji pokazalo je da se uz razinu 4 može definirati i viša razina koja uz potpuno automatiziranu transakciju uključuje i proaktivno informiranje korisnika te individualizaciju formulara za pojedinog korisnika.

**Tablica 1: Razine informatiziranosti**

Razina informatiziranosti	Značenje
0 - Nema informacije	Informacija o usluzi nije dostupna na mreži
1 - Informacija	Na mreži je dostupna samo informacija o usluzi (npr. opis postupka, pravilnici i sl.)
2 - Jednosmjerna interakcija	Dostupnost formulara u elektroničkom obliku za pohranjivanje na računalu. Prazne formulare moguće je i otisnuti na pisaču.
3 - Dvosmjerna komunikacija	Interaktivno ispunjavanje formulara i prijava uz autentikaciju. Ispunjavanjem formulara pokreće se pojedina usluga.
4 - Transakcija	Cijela usluga je dostupna na mreži, popunjavanje formulara, autentikacija, plaćanje i isporuka potvrda, narudžbe ili drugi oblici potpune usluge putem mreže.
5 - Ciljana automatizirana proaktivna usluga	Usluga je u potpunosti prilagođena individualnom korisniku, automatizirana i proaktivna. To znači da korisnik dobiva na vrijeme upozorenje da treba dostaviti neke podatke ili pokrenuti elektroničku uslugu pri čemu mu se automatski nudi elektronički formular u koji su upisane sve informacije koje o korisniku već postoje u informacijskim sustavima javne uprave.

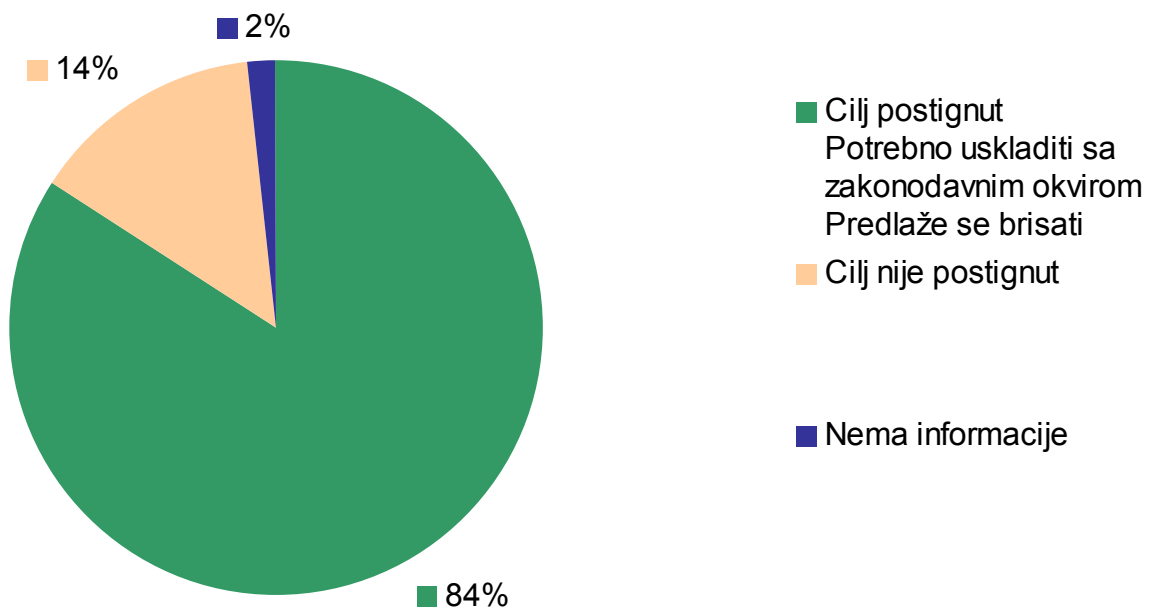

Usluge	Ukupno	%
Cilj postignut	86	76%
Predlaže se brisati	2	2%
Potrebno uskladiti sa zakonodavnim okvirom	7	6%
Cilj nije postignut	16	14%
Nema informacije	2	2%

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
10101	Prijava poreza na dohodak (GRAĐANI, POREZ NA DOHODAK)	MFIN PU	2	4	4	4
10201	Prijava u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (GRAĐANI, ZAPOŠLJAVANJE)	HZZ	2	3	3	3
10202	Pretraživanje slobodnih radnih mjesta (GRAĐANI, ZAPOŠLJAVANJE)	HZZ	3	3	3	3
10203	Podnošenje zahtjeva za dobivanje radne dozvole za stranca (GRAĐANI, ZAPOŠLJAVANJE)	MUP	2	2	2	3
10204	Podnošenje zahtjeva za dobivanje poslovne dozvole za stranca (GRAĐANI, ZAPOŠLJAVANJE)	MUP	2	2	2	3
10205	Prijava i odjava djelatnika (GRAĐANI, ZAPOŠLJAVANJE)	HZZ	3	3	3	4
10301	Podnošenje zahtjeva za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4
10302	Podnošenje zahtjeva za invalidsku mirovinu (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4
10303	Podnošenje zahtjeva za obiteljsku mirovinu (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4
10304	Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4
10305	Podnošenje zahtjeva za naknadu zbog tjelesnog oštećenja (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4
10306	Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje staža (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
10307	Podnošenje obavijesti za pretkompletiranje (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	3	3	4
10308	Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o isplaćenju mirovini (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZMO	2	2	2	4
10309	Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZZO	2	4	4	4
10310	Prijava promjene osiguranja (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZZO	2	4	4	4
10311	Odjava s osiguranja (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZZO	2	4	4	4
10312	Podnošenje zahtjeva za upućivanje na liječenje u inozemstvo (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZZO	2	3	2	4
10313	Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	HZZ	2	3	2	3
10314	Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na školarinu (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	MZOŠ	2	3	3	4
10315	Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju (GRAĐANI, SOCIJALNE NAKNADE)	MZOŠ	2	3	3	4
10401	Podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice (GRAĐANI, OSOBNİ DOKUMENTI)	MUP	1	2	2	3
10402	Podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice za strance (GRAĐANI, OSOBNİ DOKUMENTI)	MUP	2	2	2	3
10403	Podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice (GRAĐANI, OSOBNİ DOKUMENTI)	MUP	1	1	1	3

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
10404	Podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole (GRAĐANI, OSOBNI DOKUMENTI)	MUP	2	2	2	3
10405	Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka (GRAĐANI, OSOBNI DOKUMENTI)	MP	2	2	2	3
10501	Podnošenje zahtjeva za prvu registraciju motornih i priključnih vozila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	1	1	1	4
10502	Podnošenje zahtjeva za upis plovila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10503	Podnošenje zahtjeva za prvu registraciju zrakoplova (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10504	Podnošenje zahtjeva za produljenje registracije motornih i priključnih vozila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	4	4	4	4
10505	Podnošenje zahtjeva za tehnički pregled brodice (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10506	Podnošenje zahtjeva za produljenje registracije zrakoplova (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	Predlaže se brisati	4
10507	Podnošenje zahtjeva za odjavu motornih i priključnih vozila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	1	1	1	4
10508	Podnošenje zahtjeva za brisanje plovila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10509	Podnošenje zahtjeva za odjavu zrakoplova (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10510	Podnošenje zahtjeva za promjenu vlasnika motornih i priključnih vozila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	1	1	1	4

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
10511	Podnošenje zahtjeva za promjenu vlasnika plovila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10512	Podnošenje zahtjeva za promjenu vlasnika zrakoplova (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MMPI	2	2	2	4
10513	Podnošenje zahtjeva za probne pločice (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	1	1	1	4
10514	Prijava nestanka prometne dozvole/ knjižice vozila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	1	1	1	4
10515	Podnošenje zahtjeva za izdavanje nove prometne dozvole/ knjižice vozila (GRAĐANI, REGISTRACIJA PROMETNIH SREDSTAVA)	MUP	1	1	1	4
10601	Podnošenje zahtjeva za građevnu dozvolu (GRAĐANI, GRAĐEVNA DOZVOLA)	MZOPUG	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4
10602	Podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu (GRAĐANI, GRAĐEVNA DOZVOLA)	MK	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4
10603	Podnošenje zahtjeva za izvatom iz zemljišne knjige (GRAĐANI, GRAĐEVNA DOZVOLA)	MP	2	2	2	4
10604	Podnošenje zahtjeva za izvatom iz katastarskog operata (GRAĐANI, GRAĐEVNA DOZVOLA)	DGU	2	2	2	4
10605	Podnošenje zahtjeva za izvatom iz prostornog plana (GRAĐANI, GRAĐEVNA DOZVOLA)	MZOPUG	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4
10701	Prijava kaznenog djela (GRAĐANI, PRIJAVE POLICIJI)	MUP	1	2	1	3
10801	Pretraživanje sadržaja/ kataloga (GRAĐANI, JAVNE KNJIŽNICE)	MK	3	3	3	3

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
10801	Pretraživanje sadržaja/kataloga (GRAĐANI, JAVNE KNJIŽNICE)	MZOŠ	3	3	3	3
10802	Pristup/uvid u sadržaj (GRAĐANI, JAVNE KNJIŽNICE)	MK	3	3	3	3
10802	Pristup/uvid u sadržaj (GRAĐANI, JAVNE KNJIŽNICE)	MZOŠ	3	3	3	3
10901	Podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (GRAĐANI, DRŽAVNE MATICE)	SDUU	1	1	1	3
10902	Podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih (GRAĐANI, DRŽAVNE MATICE)	SDUU	1	1	1	3
10903	Podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih (smrtovnica) (GRAĐANI, DRŽAVNE MATICE)	SDUU	1	1	1	3
10904	Podnošenje zahtjeva za izdavanje dokaza o državljanstvu (domovnica) (GRAĐANI, DRŽAVNE MATICE)	SDUU	1	1	1	3
10905	Podnošenje zahtjeva za stjecanje/prestanak državljanstva (GRAĐANI, DRŽAVNE MATICE)	MUP	2	2	2	3
11001	Upis na visokoškolsku ustanovu (GRAĐANI, VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE)	MZOŠ	2	2	2	4
11002	Upis na višu godinu (GRAĐANI, VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE)	MZOŠ	4	4	4	4
11003	Upis pada / ponavljanja godine (GRAĐANI, VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE)	MZOŠ	4	4	4	4
11101	Prijava prebivališta (GRAĐANI, BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE)	MUP	2	2	2	3

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
11102	Prijava promjene adrese stanovanja (GRAĐANI, BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE)	MUP	2	2	2	3
11103	Odjava prebivališta (GRAĐANI, BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE)	MUP	2	2	2	3
11104	Prijava boravišta (GRAĐANI, BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE)	MUP	2	2	2	3
11105	Prijava/odjava boravišta/ prebivališta za strance (GRAĐANI, BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE)	MUP	1	2	1	3
11106	Prijava promjene adrese za strance (GRAĐANI, BORAVIŠTE / PREBIVALIŠTE)	MUP	1	2	1	3
11201	Naručivanje (GRAĐANI, ZDRAVSTVENE USLUGE)	MZSS	1	1	1	4
11202	Konzultacije o dostupnim uslugama (GRAĐANI, ZDRAVSTVENE USLUGE)	MZSS	1	1	1	4
20101	Podnošenje zahtjeva za osnovno zdravstveno osiguranje (PODUZETNICI, MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA)	HZZO	2	4	4	4
20102	Podnošenje zahtjeva za dopunsko zdravstveno osiguranje (PODUZETNICI, MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA)	HZZO	2	4	2	4
20103	Podnošenje zahtjeva za inozemno zdravstveno osiguranje (PODUZETNICI, MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA)	HZZO	2	4	2	4

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
20104	Prijava i odjava zaposlenika u sustavu obveznog mirovinsko osiguranje (PODUZETNICI, MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA)	HZMO	4	4	4	4
20201	Prijava poreza na dobit (PODUZETNICI, POREZ NA DOBIT)	MFIN PU	2	4	2	4
20301	Prijava Porez na dodanu vrijednost (PODUZETNICI, POREZ NA DODANU VRIJEDNOST)	MFIN PU	4	4	4	4
20401	Registracija tvrtke (PODUZETNICI, REGISTRACIJA NOVOG PODUZEĆA)	MP	2	3	3	4
20402	Registracija obrta (PODUZETNICI, REGISTRACIJA NOVOG PODUZEĆA)	MINGORP	2	3	3	4
20501	Prijava poslovnog subjekta (PODUZETNICI, PRIJAVA PODATAKA DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU)	DZS	2	2	2	3
20502	Prijava dijela poslovnog subjekta (poslovne jedinice) (PODUZETNICI, PRIJAVA PODATAKA DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU)	DZS	2	2	2	3
20601	Podnošenje carinske deklaracije za poslovne subjekte (PODUZETNICI, CARINSKA DEKLARACIJA)	MFIN CURH	3	3	3	3
20701	Podnošenje zahtjeva za uvid u prostorni plan (PODUZETNICI, ZAŠTITA OKOLIŠA)	MZOPUG	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4
20702	Podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole (PODUZETNICI, ZAŠTITA OKOLIŠA)	MZOPUG	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4
20703	Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja za odobrenje gospodarske djelatnosti (PODUZETNICI, ZAŠTITA OKOLIŠA)	MZOPUG	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
20704	Podnošenje zahtjeva za dobivanje dozvola/ izvještaja temeljem studija utjecaja na okoliš (PODUZETNICI, ZAŠTITA OKOLIŠA)	MZOPUG	1	2	Potrebno usklađivanje s novim zakonodavnim okvirom	4
20705	Podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka izdavanja uvjerenja o vremenu te izradu ekspertiza i stručnih studija (PODUZETNICI, ZAŠTITA OKOLIŠA)	DHMZ	2	3	2	4
20801	Uvid u objave javnih nadmetanja (PODUZETNICI, JAVNA NABAVA)	UJN	2	3	3	4
20901	Podnošenje zahtjeva za korištenje i raspolaganje državnom imovinom (PODUZETNICI, IMOVINA RH)	SDUUDI	2	3	2	4
30101	Podnošenje zahtjeva za kredit (OSTALE USLUGE, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	2	
30102	Prijava za dobivanje poticaja (OSTALE USLUGE, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	2	
30103	Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (PODUZETNICI, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	2	
30104	Podnošenje zahtjeva za dobivanje rješenja iz područja veterinarstva (OSTALE USLUGE, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	2	
30105	Podnošenje zahtjeva za dodjelu određene količine robe za uvoz u okviru carinske kvote (OSTALE USLUGE, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	2	
30106	Upis u Upisnik ekoloških proizvođača (OSTALE USLUGE, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	2	
30107	Podnošenje zahtjeva za dobivanje rješenja o pravu korištenja znaka ekoproizvod (OSTALE USLUGE, POLJOPRIVREDA)	MPŠVG	2	2	Predlaže se brisati	

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
30201	Prijava sudjelovanja u programima kreditiranja (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMTPR	2	3	2	
30202	Prijava i odjava turista (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMTPR	2	3	2	
30203	Prijava chartera (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMPI	4	4	4	
30204	Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata u nadležnosti ureda DU (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMTPR	1	2	1	
30205	Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata: hoteli (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMTPR	1	2	1	
30206	Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata: kampovi (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMTPR	1	2	1	
30207	Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje vrste i kategorije luke nautičkog turizma: marine (OSTALE USLUGE, TURIZAM)	MMTPR	1	2	1	
30301	Podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem (OSTALE USLUGE, KULTURA)	MK	2	3	N/A	
30302	Podnošenje zahtjeva za poreznim olakšicama za kulturu i umjetnost (OSTALE USLUGE, KULTURA)	MK	1	1	1	
30401	Prijave za inspekcijski nadzor nad trgovačkim društvima/obrtima (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	3	3	3	
30402	Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o kvaliteti uvezene robe (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	

ID	Usluga	Nositelj	Stanje 2006.	Cilj 2007.	Stanje 12-2007.	Cilj eEuropa
30403	Podnošenje zahtjeva za izdavanje certifikata za posude pod tlakom (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30404	Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja inspektoru rada za sudjelovanje malodobnika mlađih od 15 godina u naplatnom sudjelovanju u snimanju filmova (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30405	Podnošenje zahtjeva za obavljanjem nadzora radi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30406	Izdavanje obavijesti o početku izvođenja radova (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30407	Podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preraspodjelu radnog vremena (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30408	Izdavanje obavijesti o prekovremenom radu radnika (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30409	Dostavljanje godišnjeg izvješća o ozljedama na radu (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30410	Prijava smrtnih, skupnih i teških ozljeda (OSTALE USLUGE, DRŽAVNE INSPEKCIJE)	DI	2	2	2	
30501	Evidentiranje zbirke osobnih podataka u Središnji registar (OSTALE USLUGE, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA)	AZOP	3	3	3	
30502	Uvid u Središnji registar evidencija zbirke osobnih podataka (OSTALE USLUGE, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA)	AZOP	4	4	4	

### 3 Pregled kratica

Kratica	Opis kratice
AAI	autentikacijska i autorizacijska infrastruktura
ADSL	asimetrična digitalna pretplatnička linija (engl. <i>Asymmetric Digital Subscriber Line</i> )
AIDE	Automatsko indeksiranje Deskriptorima Eurovoca – usluga Hidre
APIS IT	Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
ASN	broj (oznaka) autonomnog sustava, broj koji se dodjeljuje IP mreži ili grupi IP mreža kojima upravlja(ju) jedan ili više mrežnih upravitelja, a u kojima se primjenjuje jedinstvena politika usmjeravanja mrežnog prometa (eng. <i>Autonomous System Number</i> )
AZO	Agencija za zaštitu okoliša
AZOO	Agencija za odgoj i obrazovanje
AZOP	Agencija za zaštitu osobnih podataka
bSEE	Inicijativa u okviru Pakta o stabilnosti za poticanje širokopojsnog pristupa Internetu u jugoistočnoj Europi (engl. <i>broadband South Eastern Europe</i> )
BZP	Baza zemljišnih podataka
CARDS	Program Europskih Zajednica za pomoć u obnovi, razvitku i stabilizaciji (engl. <i>Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation</i> )
CARNet	Hrvatska istraživačka i akademska mreža (engl. <i>Croatian Academic and Research Network</i> )
CEPT	Europski kongres administracija za poštu i telekomunikacije (franc. <i>Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications</i> )
CERT	nacionalno središte za sigurnost na mreži (engl. <i>Computer Emergency Response Team</i> )
CIP	Okvirni program Europskih Zajednica za konkurentnost i inovativnost (engl. <i>Competitiveness and Innovation Programme</i> )
CIP ICT	Druga komponenta programa CIP – komponenta za financiranje provedbe odrednica razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. <i>Competitiveness and Innovation Programme – Information and Communication Technology Policy Support Programme</i> )
CISZP	Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača RH
CIX	hrvatski centar za razmjenu nacionalnog Internet prometa (engl. <i>Croatian Internet eXchange</i> )
CRO-GRID	projekt uspostave hrvatske grid infrastrukture, hrvatska grid infrastruktura
DAMIR	Digitalni Arhiv Mrežnih Izvora RH – usluga Hidre
DGU	Državna geodetska uprava
DHMZ	Državni hidrometeorološki zavod
DI	Državni inspektorat
DKKPJN	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
DZS	Državni zavod za statistiku
DZM	Državni zavod za mjeriteljstvo
DZNS	Državni zavod za nuklearnu sigurnost
ECDL	europski standard za provjeru osnovnog znanja rada na računalu – europska vozačka dozvola za računalu (engl. <i>European Computer Driving Licence</i> )

Kratica	Opis kratice
EGEE	Projekt Europskih zajednica za uspostavljanje zajedničke grid infrastrukture Europskog istraživačkog prostora (engl. <i>Enabling Grids for E-science</i> )
ERA	europski znanstveno-istraživački prostor (engl. <i>European Research Area</i> )
ERP	intergirani informacijski sustav za upravljanje resursima poduzeća (engl. <i>Enterprise Resource Planning</i> )
ESUD	Elektronički sustav za upravljanje dokumentacijom
ETSI	Europski zavod za telekomunikacijske norme (engl. <i>European Telecommunications Standards Institute</i> )
EU	Europska unija
Eurovoc	višejezični tezaurus iz područja aktivnosti Europskih zajednica. Omogućava indeksiranje dokumenata u dokumentacijskim sustavima europskih institucija i njihovih korisnika. Dostupan je na 21 jeziku zemalja članica EU i na hrvatskom jeziku
FER	Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
FINA	Financijska agencija
FP7	Sedmi okvirni program – program Europskih zajednica za znanstvena istraživanja i razvitak (engl. <i>7<sup>th</sup> Framework Programme</i> )
GAC	Savjetodavni odbor vlada Međunarodne organizacije za pridružena imena i brojeve (engl. <i>Governmental Advisory Committee</i> )
GÉANT2	paneuropska mreža koja povezuje nacionalne akademske mreže (engl. <i>Global European Academic NeTwork</i> ; franc. <i>géant</i> = div)
GZAOP	Gradski zavod za automatsku obradu podataka (sada APIS IT)
HAT	Hrvatska agencija za telekomunikacije
HDA	Hrvatski državni arhiv
HGK	Hrvatska gospodarska komora
HIDRA	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
HIT	Hrvatski institut za tehnologiju doo
HITRA	Program hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka
HITRONet	Računalno komunikacijska mreža tijela državne uprave
HIZ	Hrvatski informatički zbor
HRM	upravljanje ljudskim resursima (engl. <i>Human Resource Management</i> )
HTML	jezik za označavanje hiperteksta (teksta s poveznicama), podskup standardnog općeg jezika za označavanje (engl. <i>HyperText Markup Language</i> )
HZJZ	Hrvatski zavod za javno zdravstvo
HZMO	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
HZN	Hrvatski zavod za norme
HZPSS	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
HZZ	Hrvatski zavod za zapošljavanje
HZZO	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
IBIS	Integrirani bolnički informacijski sustav
ICANN	Međunarodna organizacija za pridružena imena i brojeve – organizacija zadužena za globalnu koordinaciju sustava jedinstvenih identifikatora na Internetu (engl. <i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers</i> )
ICMS	Integralni informacijski sustav upravljanja sudskim predmetima (engl. <i>Integrated Case Management System</i> )
ICT	informacijsko komunikacijska tehnologija (engl. <i>Information and Communications Technology</i> )

Kratica	Opis kratice
ID	oznaka obrasca Izvješća o primicima od nesamostalnog rada, (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
IDABC	Program Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (engl. <i>Community Programme for Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens</i> )
IDD	oznaka obrasca Izvješća o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
IEC	Međunarodno povjerenstvo za elektrotehniku – međunarodno tijelo za normizaciju i certifikaciju u području elektrotehnike (engl. <i>International Electrotechnical Commission</i> )
IFAP	UNESCO-v Program informacije za sve (engl. <i>Information For All Programme</i> )
IKT	informacijsko komunikacijska tehnologija
INFOSEC	sigurnost informacijskih sustava (engl. <i>Information Systems Security</i> )
IP	Internet protokol
IPA	Instrument za predpristupnu pomoć Europskih zajednica (engl. <i>Instrument for Preaccession Assistance</i> )
IRB	Institut Rugjer Bošković, Zagreb
IRKI	Izgradnja računalno – komunikacijske infrastrukture
IS	informacijski sustav
ISO	Međunarodna organizacija za normizaciju (engl. <i>International Organization for Standardization</i> )
ISVU	Informacijski sustav visokih učilišta
IT	informacijska tehnologija
ITMS	Integrirani sustav za upravljanje tarifama (engl. <i>Integrated Tariff Management System</i> )
ITU	Međunarodna telekomunikacijska unija
JBK	Javnobilježnička komora
LAN	lokalna računalna mreža (engl. <i>Local Area Network</i> )
LMS	sustav za upravljanje učenjem (engl. <i>Learning Management System</i> )
MDC	Muzejski dokumentacijski centar
MFIN	Ministarstvo financija
MFIN CURH	Ministarstvo financija – Carinska uprava
MFIN PU	Ministarstvo financija – Porezna uprava
MINGORP	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
MK	Ministarstvo kulture
MMTPR	Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
MMPI	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
MT	Ministarstvo turizma
MOBMS	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
MORH	Ministarstvo obrane
MP	Ministarstvo pravosuđa
MPŠVG	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
MPRRR	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
MRRŠVG	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
MUP	Ministarstvo unutarnjih poslova
MVPEI	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Kratica	Opis kratice
MZOPUG	Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
MZOŠ	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
MZSS	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
NACE	Statistička klasifikacija gospodarskih djelatnosti u Europskim zajednicama
NATO	Organizacija sjevernoatlantskog saveza (engl. <i>North Atlantic Treaty Organization</i> )
NCSA	Središnje nacionalno komunikacijsko sigurnosno tijelo, odgovorno za usklađenost tehničkih sigurnosnih mjera (engl. <i>National Communications Security Authority</i> )
NCTS	Novi računalno podržani sustav provoza (engl. <i>New Computerized Transit System</i> )
NIPP	Nacionalna infrastruktura prostornih podataka
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NPIS	Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
NPPEU	Nacionalni program pristupanja Europskoj uniji
NSA	Središnje državno sigurnosno tijelo odgovorno za usklađenost općih sigurnosnih mjera u državi (engl. <i>National Security Authority</i> )
NSK	Nacionalna i sveučilišna knjižnica
NVID	Nacionalno vijeće za informacijsko društvo
ODI	Očevidnik državne imovine
PHARE	program za predpristupnu pomoć Europske unije pokrenut kao pomoć Poljskoj i Mađarskoj (engl. <i>Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies</i> ) 1989. godine, do 2006. godine proširivan na ostale zemlje kandidate. Od 2007. godine zamjenjuje ga IPA
PZZ	Primarna zdravstvena zaštita
REGOS	Središnji registar osiguranika
RIR	regionalni Internet registar – organizacija koja nadzire, raspačava i registrira javne IP adrese u regiji (engl. <i>Regional Internet Registry</i> )
RKM TDU	Računalno komunikacijska mreža tijela državne uprave (sada HITRONet)
ROSA	Registri, Obrasci, Servisi, Arhivi – usluga Hidre
RPS	Registar poslovnih subjekata
RUP	okvir za proces iterativnog razvoja softvera (engl. <i>Rational Unified Process</i> )
SC	Studentski centar
SD	Studentski dom
SDUeH	Središnji državni ured za e-Hrvatsku
SDURF	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU
SDUU	Središnji državni ured za upravu
SDUUDI	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
SEED	Sustav razmjene podataka o trošarinama u Europskoj uniji (engl. <i>System for the Exchange of Excise Data</i> )
SLA	sporazum o razini kakvoće usluga (engl. <i>Service Level Agreement</i> )
SMS	usluga slanja/primanja kratkih tekstualnih poruka na mobitelu, usluga kratkih poruka (engl. <i>short message service</i> )
SOA	Servisno orijentirana arhitektura (engl. <i>Service Oriented Architecture</i> )
SRCE	Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
SSP	Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Kratica	Opis kratice
TARIC	Integrirane tarife Europskih zajednica – sustav harmoniziranih pravila i nomenklature proizvoda koji se primjenjuje pri uvozu robe u EU (engl. <i>Integrated Tariff of the European Communities</i> )
TB	tera bajt ( $10^{12}$ bajta)
TDU	Tijelo državne uprave
TEMPUS	Transeuropski program mobilnosti visokoškolskih studija – program Europskih zajednica za poticanje europske suradnje u području razvoja studijskih programa, trajnog obrazovanja profesora i predavača, upravljanja sveučilištima i strukturalnih reformi visokog školstva (engl. <i>Trans-European mobility scheme for university studies</i> )
TEST	Program tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata (Hrvatski institut za tehnologiju)
TESTA-S	sigurna mreža koja povezuje nacionalne domene javnih uprava zemalja članica Europske unije i zemalja koje sudjeluju u Programu IDABC
TO Z1	zajednički tehnički odbor za informacijsku tehnologiju pri Hrvatskom zavodu za norme, (odgovara međunarodnom tehničkom odboru <i>ISO/IEC JTC1 Information Technology</i> )
UJN	Ured za javnu nabavu
UNESCO	Organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu Ujedinjenih naroda (engl. <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> )
UVNS	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
VEM	Vijeće za elektroničke medije
VPN	virtualna privatna mreža (engl. <i>Virtual Private Network</i> )
WAN	računalna mreža koja pokriva šire zemljopisno područje (engl. <i>Wide Area Network</i> )
WCAG	Preporuke za dostupnost mrežnog sadržaja (engl. <i>Web Content Accessibility Guidelines</i> )
WSA	Nagrada Svjetskog samita (engl. <i>World Summit Award</i> )
WSIS	Svjetski samit o informacijskom društvu održan 2003. u Ženevi i 2005. u Tunisu (engl. <i>World Summit on Information Society</i> )
ZSIS	Zavod za sigurnost informacijskih sustava
XML	proširivi jezik za označavanje podataka, podskup standardnog općeg jezika za označavanje (engl. <i>Extensible Markup Language</i> )

## 4 Popis koordinatora

Tijelo javne vlasti	Koordinator
Ministarstvo financija	Ivan Rašeta
Ministarstvo financija, Carinska uprava	Zlatica Tomašević
Ministarstvo financija, Porezna uprava	Milan Klišanić
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Miljenko Pavlaković
Ministarstvo kulture	Marica Mikec
	Jasminka Draženović
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Ivančica Urh
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	Mario Reiner
Ministarstvo obrane	mr. sc. Darko Galinec
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	Nataša Benić Einbüchler
	Davor Kralj
Ministarstvo pravosuđa	Tanja Magdić Ukalović
Ministarstvo unutarnjih poslova	Josip Trbuščić
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	Alena Aganović Boras
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	Damir Stanić
	Vladimir Galić
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	Ante Zvonimir Golem, dr. med.
	Zlata Kedžo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlasta Mijić
	Sabina Kovačević Rajič
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Vladimir Juriša
Ministarstvo turizma	Davor Ižaković
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije	Damir Pavao Govorčin
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	Katarina Čop
Središnji državni ured za upravu	Leda Lepri
Središnji državni ured za e-Hrvatsku	dr. sc. Diana Šimić
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost	mr. sc. Aleksandar Klaić
Vlada Republike Hrvatske, Ured za javnu nabavu	Ivan Žilić
	Ivančica Marinović
Državna geodetska uprava	Zoran Vujić
Državni hidrometeorološki zavod	mr.sc. Ivanka Mihovilić
Državni inspektorat	Petar Baburić
	Renata Diankov

<b>Tijelo javne vlasti</b>	<b>Koordinator</b>
Državni zavod za intelektualno vlasništvo	Mario Jandrek
Državni zavod za mjeriteljstvo	Ivica Borošak, dipl. ing.
	Valerija Volarić Bonefačić
Državni zavod za nuklearnu sigurnost	Ivan Poljičanin
Državni zavod za statistiku	Branka Cimermanović
Državni zavod za zaštitu od zračenja	Nikša Sviličić
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	Miroslav Pavić
	Darko Stičak
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA	Ana Garvas Delić
	Maja Cvitaš
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT d.o.o.	Dunja Jurica
	Mladen Kostešić
Agencija za zaštitu okoliša	Jasna Butuči
	Robert Labavić
Agencija za zaštitu osobnih podataka	Vilena Gašparović
	Juraj Ljubešić
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	Mislav Kršulović
Financijska agencija	Ante Šimunović
Hrvatska agencija za telekomunikacije	mr. sc. Marijan Borovac
Hrvatska gospodarska komora	mr. sc. Marijan Frković
Hrvatski državni arhiv	Jozo Ivanović
Hrvatski zavod za norme	Snježana Zima
	Jasminka Čupurdija
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	Zoran Kordić
Hrvatski zavod za zapošljavanje	Ilija Rašić
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	Hrvoje Jezidžić
Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu	Vanda Čuljat
	Goran Klopotan
Središnji registar osiguranika - REGOS	Damir Korošić
	Đorđe Nižetić
Hrvatska akedemska i istraživačka mreža - CARNet	Zvonimir Stanić
	Vlado Pribolšan
